


新貨物ターミナル工事 2週間工程表

7月28日（月）～ 8月10日（日）

【7/27更新】

<主な工事箇所>

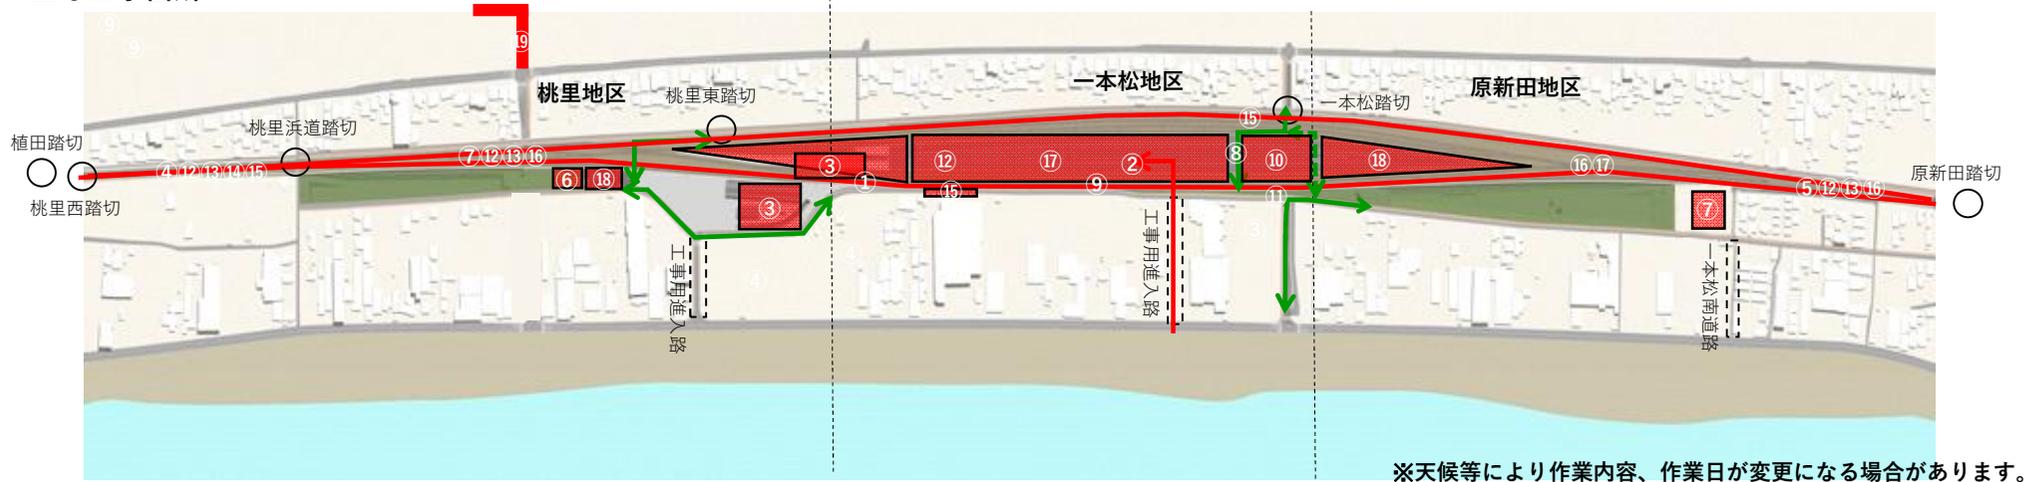

施工業者	施工場所	主な工事の内容	7月				8月										備考
			28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	
1 東亜道路工業(株)	①	排水工	●	●	●	●	-	-	休工	-	-	-	-	-	-	休工	10tダンプトラック：1～2台/日
	②	排水工	-	●	●	●	●	●	休工	●	●	●	●	●	●	休工	
2 名工建設(株)	③	場内整備工	●	●	●	●	●	●	休工	●	●	●	●	●	●	休工	バックホウ
3 名工建設(株)	④	排水工	●	●	●	●	●	●	休工	●	●	●	●	●	休工	大型車による製品搬入等	
	⑤	路盤工	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●			
	⑥	躯体工	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●			
	⑦	フェンス設置工	●	●	●	●	●	●		-	-	-	-	-			
	⑧	迂回路整備工	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4 名工建設(株)	⑨	軌道新設工	●	●	●	●	●	●	休工	●	●	●	●	●	●	休工	10tダンプトラック：3～5台/日
5 名工建設(株)	⑩	場内整備工	●	●	●	●	●	-	休工	●	●	●	-	-	休工	25tクレーン：7/28～ 車両通行止め（工事完了まで）	
	⑪	配水管設置工	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	休工		
12 新生テクノス(株)	⑫	電気工事（電柱建柱工）	●	●	-	-	●	●	休工	-	-	-	-	-	休工	夜間工事：7/27（日）、7/28（月）、8/1（金）	
	⑬	電気工事（基礎掘削工）	-	-	-	-	●	-	休工	-	-	-	-	-	休工		
13 新生テクノス(株)	⑭	電気工事（高圧ケーブル設置等）	●	-	-	-	-	休工	-	-	-	-	-	-	休工		
14 新生テクノス(株)	⑮	電気工事（小型管路設置工等）	-	-	-	●	●	●	休工	●	-	-	-	-	休工		
	⑯	電気工事（ケーブル布設工）	-	-	-	-	-	-	休工	-	●	●	-	-	休工		
23 名工建設(株)	⑰	分岐器新設工	●	●	●	●	●	●	休工	●	●	●	●	●	休工	10tダンプトラック：3～5台/日	
26 名工建設(株)	⑱	建築工（内外装工）	●	●	●	●	●	●	休工	●	●	●	●	●	休工		
27 大藤建設（株）	⑲	箱型構造物工	●	●	●	●	●	●	休工	●	●	●	●	●	休工	市道02057号線（桃里公民館前）車両通行止め（R7.7月14日～R7.10月下旬）	
