
## 新貨物ターミナル工事 2週間工程表

9月8日 (月) ~ 9月21日 (日)

<主な工事箇所>

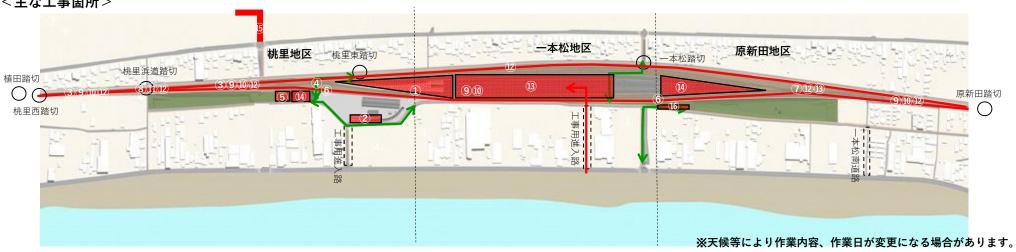

			T	9月														
	施工業者	施工																
		場所	主な工事の内容	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	備  考
		场川		月	火	水	木	金	土	日	月	月火	水	木	金	土	日	
1	東亜道路工業(株)	1	排水工・擁壁工	•	•	•	•	•	•	● <sub>休工</sub>	•	•	•	•	•	•	→ 休丁 I	10tダンプトラック:1~2台/日
		2	土工	•	•	•	•	•	•	1/1/上	•	•	•	•	•	•		場内運搬(一本松アンダー道路付近まで)
3	名工建設(株)	3	除草工・排水工撤去	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•		草刈り機・ブレーカー使用
		4	<b>王回路整備工</b>	-	-	-	-	_	•	休工		_	-	_	_	_	休工	大型車による製品等納入(桃里浜道踏切~
		<b>5</b>	信号機室設置工	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•		中道・フロント部〜名工建設現場事務所
		6	排水工	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•		間)
	名工建設(株)	7	軌道新設工											•	•	-	4-	10tダンプトラック:3~5台/日
				•	•	•	•	•	•		•	•	•					(名工建設現場事務所~作業ヤード)
4		8	踏切改修工			_	_	_	_	休工					-		休工	9/9 (火) ~9/10 (水) : 桃里浜道踏切車
				_	•	•					_	_	_	_				両通行止め
12	新生テクノス(株)	9	電気工事(電柱建柱工)	_	•	<b>&gt;</b> •	_	_	_	-   ,, _	•	<b>&gt;</b> •••	•	_		_	//	夜間工事:9/9(火)、9/15(月)、9/16
		(10)	電気工事(基礎工・電車線設置工)	•	_	_	_	_	_	休工	•	_	_	•	_	_	休工	(火)
13	新生テクノス(株)	<u>(11)</u>	電気工事(電気設備工等)	_	_	•	_	_	休	I I	_	•	• • •		休	I	2tダンプトラック:9/16(火)~	
	新生テクノス(株)	12	電気工事(ケーブル布設工等)			•	•	•	•			_						夜間工事:9/10(水)(桃里浜道踏切付
14				•	•					休工	•		_	_	•	1/1	ΣI	近)※踏切も閉鎖
	( (14)		0.14.00.44.50	_		_	_	_	// —						_	_	l	10tダンプトラック:3~5台/日
23	名工建設(株)	13	分岐器新設工	•	•	•	•	•	1木	休工		•	•		•	•	休工	(名工建設現場事務所〜作業ヤード)
26	名工建設(株)	<b>14</b>	建築工(内外装工)	•	•	•	•	•	•	休工	•	•	•	•	•	•	休工	
27	大藤建設(株)	15	箱型構造物工		•		•	•			1							市道02057号線(桃里公会堂前)車両通行
				•		•			休工			•		_	_	休	×Ι	止め(R7.7月14日~R7.10月下旬)
20	(#t) +/ @ **	<u> </u>	*/ <del>*</del> /						/-1	- T						/-1		
30	(株)一杉興業	16	準備工			•		•	111	I.	•		•			1/1		
