


新貨物ターミナル工事 2週間工程表

8月11日（月） ～ 8月24日（日）

【8/10更新】

<主な工事箇所>

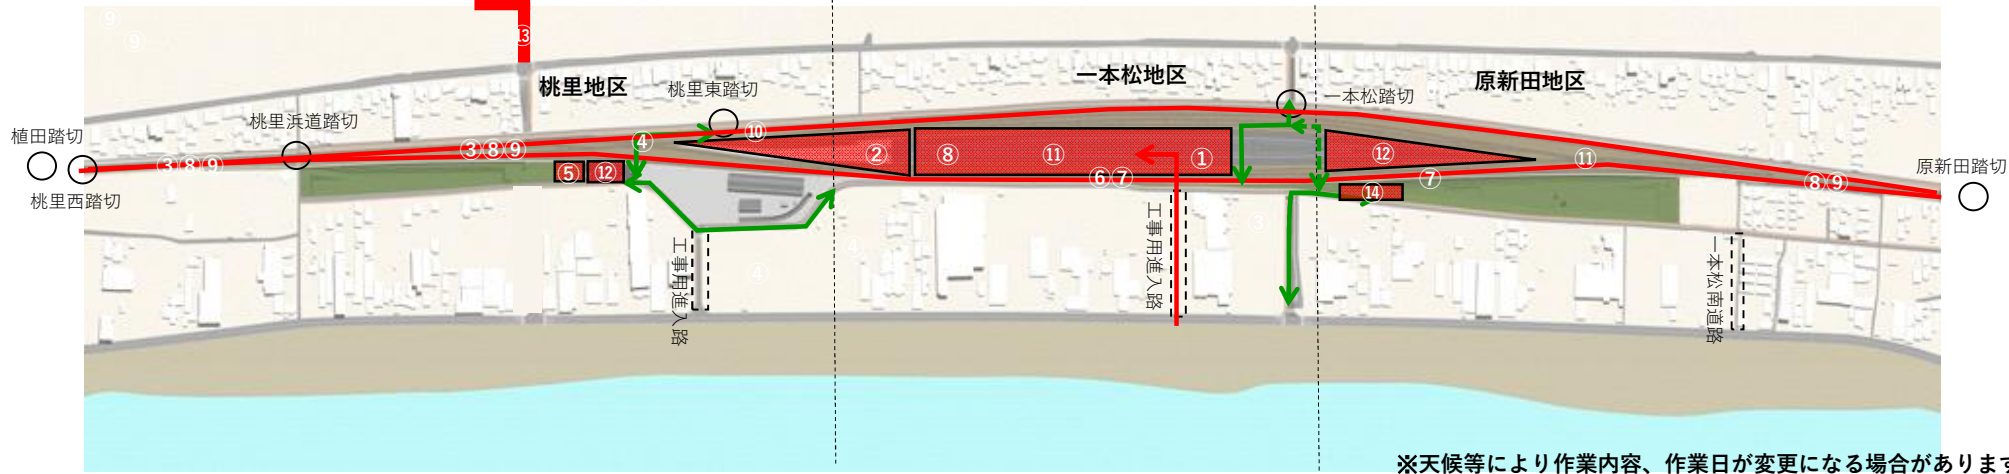

施工業者	施工場所	主な工事の内容	8月														備 考
			11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
			月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	
1 東亜道路工業(株)	①	排水工・土工	●	●	休工				●	●	－	－	－	－	休工	10tダンプトラック：1～2台/日	
	②	軌道横断工	－	－					●	●	●	●	●	●			
3 名工建設(株)	③	フェンス設置工	休工						●	●	●	●	●	●	休工	大型車による製品等納入 （中道・フロント部～桃里浜道踏切間）	
	④	迂回路整備工							●	●	●	●	●	●			
	⑤	信号機室設置工							●	●	●	●	●	●			
4 名工建設(株)	⑥	軌道新設工	休工						●	●	●	●	●	休工	10tダンプトラック：3～5台/日		
	⑦	レール運搬工							－	－	－	●	－			ポールトレーラー進入：8/21（木）午前5時～6時頃	
12 新生テクノス(株)	⑧	電気工事（電柱建柱工）	休工						－	－	－	●	●	休工	夜間工事：8/22（金）		
	⑨	電気工事（基礎掘削工）							●	－	－	●	●				
13 新生テクノス(株)	⑩	電気工事（電柱搬入工）	休工										●	休工	4tユニック：10時～（電柱仮置き）		
23 名工建設(株)	⑪	分岐器新設工	休工						●	●	●	●	●	休工	10tダンプトラック：3～5台/日		
26 名工建設(株)	⑫	建築工（内外装工）	休工						●	●	●	●	●	●	休工		
27 大藤建設（株）	⑬	箱型構造物工	●	●	休工				●	●	●	●	●	休工	市道02057号線（桃里公会堂前）車両通行止め（R7.7月14日～R7.10月下旬）		
30 （株）一杉興業	⑭	準備工	休工						●	●	●	●	●	休工			
