


新貨物ターミナル工事 2週間工程表

11月17日（月） ～ 11月30日（日）

【11/16更新】

<主な工事箇所>

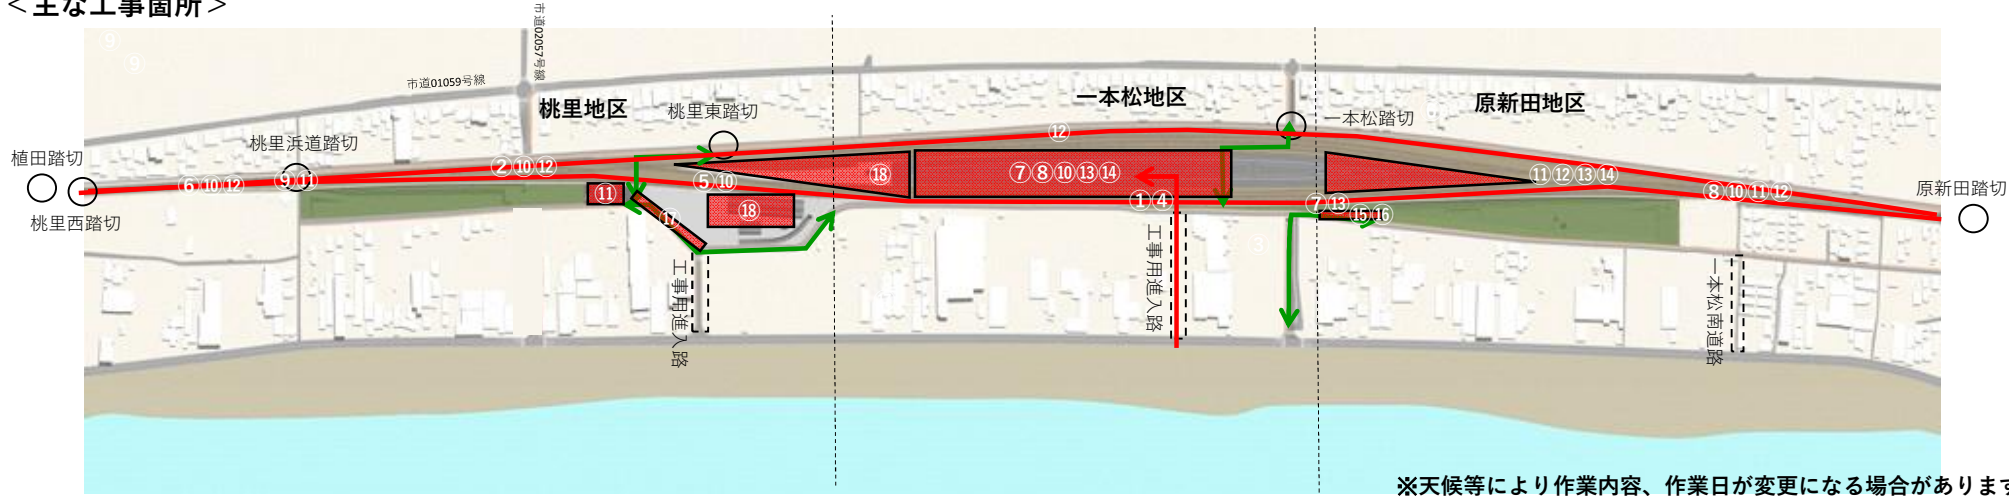

施工業者	施工 場所	主な工事の内容	11月														備 考	
			17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
			月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日		
1	東亜道路工業(株)	①	排水工・路盤工	－	－	－	－	－	－	－	－	●	●	●	●	●	休工	10tダンプトラック：1～2台/日
3	名工建設(株)	②	路盤工	●	●	－	－	－	－	休工	－	－	－	－	－	－	休工	大型車による製品等納入（桃里浜道踏切～中道・フロント部～テクノサイエンス間）
		③	路盤工・防護工撤去	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●				
		④	排水工	●	●	●	●	●	●		－	－	－	－	－	－		
		⑤	防護工設置	－	－	－	－	－	－		－	●	●	●	●	●		
		⑥	除草工	－	－	－	－	－	－		－	－	●	●	●	●		
4	名工建設(株)	⑦	軌道新設工	●	●	●	●	●	休工	●	●	●	●	●	●	●	休工	10tダンプトラック：3～5台/日 （名工建設現場事務所～作業ヤード）
		⑧	分岐器新設工	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	※碎石積卸し時、締固め時に騒音振動有		
		⑨	踏切警備	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	令和8年5月中旬まで（24時間）
12	新生テクノス(株)	⑩	電気工事（電車線設置等）	●	－	－	●	●	休工	●	●	●	●	●	●	●	休工	夜間工事：11/16（日）、11/23（日）、11/24（月）、11/27（木）、11/28（金）
13	新生テクノス(株)	⑪	電気工事（高圧設備撤去工）	－	●	●	●	－	●	休工	－	－	－	－	－	－	休工	
14	新生テクノス(株)	⑫	電気工事（設備撤去工）	－	－	●	●	－	休工		－	●	－	－	－	－	休工	夜間工事：11/8（土）（桃里浜道踏切部）
23	名工建設(株)	⑬	軌道新設工	●	●	●	●	●	休工	●	●	●	●	●	●	●	休工	10tダンプトラック：3～5台/日 （名工建設現場事務所～作業ヤード）
		⑭	分岐器新設工	●	●	●	●	●		－	－	－	－	－	－	－		※碎石積卸し時、締固め時に騒音振動有
30	(株)一杉興業	⑮	ブロック積擁壁工	●	●	●	●	●	休工		●	●	●	●	●	－	休工	
31	落合建設（株）	⑯	準備工（測量等）	●	●	●	●	●	休工		●	●	●	●	●	●	休工	
32	(株)大志建設	⑰	側溝設置・既設取り壊し工	●	●	●	●	●	休工		●	●	●	●	●	●	休工	
33	名工建設（株）	⑱	建物位置出し	●	●	●	●	●	休工			●	●	●	●	－	休工	
